


ელფოსტა: realekspert2015@gmail.com



Email: realekspert2015@gmail.com



entlangem Vordach, auf dem ein großer, weißer, zylindrischer Behälter steht, der mit Wasser gefüllt ist. Ein Mann in einem dunklen Mantel steht neben dem Behälter und hält einen langen, dünnen Stab in der Hand. Er scheint den Wasserstand zu kontrollieren. Im Hintergrund ist ein Teil eines Gebäudes mit einem roten Dach zu sehen.

ინსპექტირების ანგარიში

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.683.17

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის ინსპექტირება (ფორმა №2).

ინსპექტირების ობიექტი: ხულოს მუნიციპალიტეტი, მთა საჯოგიადან ნეგოიაში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP.G09.683.17

დამკვეთი: შპს „B&B“ ს.კ. 404390039, დირ: ბერდია ბანძელაძე.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: დავით გელიაშვილი.

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის -- ფორმა №2-ის ინსპექტირება.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: 2016 წლის 29 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №162 (SPA-160016733), ხარჯთღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოთა აქტი (ფორმა №2), ფარული სამუშაოთა აქტები.

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 12.07.2017წ. – 24.07.2017წ

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

შპს „B&B“-ს მიერ, ხულოს მუნიციპალიტეტში, მთა საჯოგიადან ნეგოიაში, სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოებზე, ამ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 283045.62 ლარს (ორას ოთხმოცდასამი ათას ორმოცდახუთი ლარი და 62 თეთრი) დღგ-სა და სხვა ნორმატიული დარიცხვების გათვალისწინებით, ნაცვლად წარმოდგენილი 291162.75 ლარისა (ორას ოთხმოცდათერთმეტი ათას ას სამოცდაორი ლარი 75 თეთრი). სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 8117.13 ლარს (რვა ათას ასჩვიდმეტი ლარი და 13 თეთრი).

დანართი: შუალედური შესრულებული სამუშაოთა აქტი 5 ფ-ზე; ფოტოილუსტრაცია 4 ფ-ზე; ფარული სამუშაოთა აქტები 5 ფ-ზე.

გამოკვლევა



როგორც წარმოდგენილი განცხადებიდან ირკვევა, გამოსაკვლევ ობიექტი მდებარეობს ხულოს მუნიციპალიტეტში, სადაც შპს „B&B“-ს მიერ შესრულებულია მთა საჯოგიადან ნეგოიაში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოები.

ინსპექტირებაზე კვლევისთვის წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები: 2016 წლის 29 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №162 (SPA-160016733), ხარჯთღირებულება ღირებულებით 872 811.00 ლარზე (რვაას სამოცდათორმეტი ათას რვაას თერთმეტი ლარი 00 თეთრი), შუალედური შესრულებული სამუშაოთა აქტი (ფორმა №2) ღირებულებით 291 162.75 ლარზე (ორას ოთხმოცდათერთმეტი ათას ას სამოცდაორი ლარი 75 თეთრი), ფარული სამუშაოთა აქტები.

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევ ობიექტი, სადაც შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად ჩავატარეთ შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილის აზომვები, ხოლო ის სამუშაოები რომლებიც მიეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, გაზიარებული იქნა წარმოდგენილი, დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოთა აქტებიდან (იხ. დანართად).

ობიექტის ადგილზე შესწავლით დადგინდა, რომ №1 და №2 სათავე ნაგებობის მოწყობაზე, „სათავე ნაგებობის სანიტარული ზონის შემოღობვა მავთულბადით, დაბეტონებულ ლითონის მილებზე და კუტიკარის მოწყობით“ - შესრულებული სამუშაო დღეის მდგომარეობით მოშლილია (იხ. ფოტოილუსტრაცია), ამიტომ აღნიშნული სამუშაო, ინსპექტირებით არ იქნა გაზიარებული და შესაბამისად მისი ღირებულება ამოღებული იქნა შესრულებული სამუშაოს აქტიდან (იხ. დანართში გაშუქებული ნაწილი).

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შპს „B&B“-ს მიერ, ხულოს მუნიციპალიტეტში, მთა საჯოგიადან ნეგოიაში, სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოებზე, ამ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 283045.62 ლარს (ორას ოთხმოცდასამი ათას ორმოცდახუთი ლარი და 62 თეთრი) დღგ-სა და სხვა ნორმატიული დარიცხვების გათვალისწინებით, ნაცვლად წარმოდგენილი 291162.75 ლარისა (ორას ოთხმოცდათერთმეტი ათას ას სამოცდაორი ლარი 75 თეთრი). სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 8117.13 ლარს (რვა ათას ასჩვიდმეტი ლარი და 13 თეთრი).

ობიექტის ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია (გარდა სანიტარული ღონისძიებებისა).

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: სიგრძის მზომი (ლაზერული)-006, STANLEY TLM 330, № 1354656039

საზომი ლენტი (რულეტი) №1- 002, LIANGJIN

სიგრძის მზომი ბორბალი - №30, 0/999მ(m) დ.ფ. 1,0სმ (sm), 0,08

მიკრომეტრი გლუვი -013, 0-25მმ(mm) დ/ფ 0,01მმ.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია: სამშენებლო წესები და ნორმები.

შესრულებული ინსპექტორი: დავით გელიაშვილი



ტექნიკური მენეჯერი: მამუკა ჩინჩალაძე



ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს დეპარტამენტის უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



ფურცლა №2



[illegible]

*** ხარჯთაღრიცხვა №3 ადგილ ბოდიშთან შუალედ, რეზერვუარის მოწყობაზე**

* ხარჯთაღრიცხვა №3 ადგილ ბოდიშთან შუალედ, რეზერვუარის მოწყობაზე									
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	8.00	15.00	120.00				
2	მაგისტრალზე შეუღებულ ავზის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონით,	100 მ3	0.07	17550.00	1228.50				
3	არსებულ ჭაზე ლითონის თავსახურის მოწყობა კუთხოვანი 50X50X4 და ფურცლოვანი 3მმ	ტ	0.13	2400.00	312.00				
4	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-219X4.5 მმ პიდრავალიკური შემოწმებით	მ	3.00	45.00	135.00				
5	ლითონის მილის მონტაჟი დ-273X5 მმ-მდე პიდრავალიკური შემოწმებით	მ	1.50	150.00	225.00				
6	ფოლადის მილტუჩის მონტაჟი დ-200	ც	2.00	65.00	130.00				
7	ფოლადის მილტუჩის მონტაჟი დ-250	ც	2.00	43.50	87.00				
8	თუჯის დ-250მმ ურდულის მონტაჟი 36-10	ც	1.00	400.00	400.00				
9	თუჯის ურდული დ-200მმ მონტაჟი 36-6	ც	1.00	350.00	350.00				
10	სათავე წაგებობის საპროექტო ზონის შეღებვა მავთულბადით, დაბეტონებულ ლითონის მილებზე და კუთხოვარის მოწყობით.	მ	50.00	50.00	2500.00				
11	კუთხოვრის კონსტრუქცია (კვ.მილი 50x50x2, მავთულბადი) მოწყობა	ც	1.00	120.00	120.00				
	ჯამი	ლარი			5607.50				
	მათ შორის:								
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			1571.00				
	2. მანქანები	ლარი			536.50				
	3. მასალები	ლარი			3500.00				
	ჯამი	ლარი			5607.50				
	სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%		175.00				
	ჯამი	ლარი			5782.50				
	ზედნაღები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%		462.60				
	ჯამი	ლარი			6245.10				
	გემშიური დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლარი	6%		374.71				
	სულ ჯამი	ლარი			6619.81				
ხარჯთაღრიცხვა №4 მდინარეზე ფოლადის მილით გადასასვლელების მოწყობაზე									
მილის დამჭერი ბურჯების მოწყობა მდინარის კალაპოტის გადაკვეთაზე									
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ბურჯებისათვის ექსკავატორით	მ3	3.50	6.00	21.00	3.50	21		
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	0.35	15.00	5.25	0.35	5.25		
3	ფოლადის საყრდენი მილების მონტაჟი დგარებად	ტ	0.23	2500.00	575.00	0.23	575		
4	საყრდენების დაბეტონება 8-20	100 მ3	0.03	10400.00	312.00	0.03	312		
5	საკიდების მოწყობა 20ც და ტროსის გაჭიმვა მილის შესაკიდად 20მ.	ტ	0.02	15000.00	300.00	0.00	0		
	ჯამი	ლარი			1213.25		913.25		
	მათ შორის:								
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			187.00		140.7605605		
	2. მანქანები	ლარი			21.25		15.99551824		
	3. მასალები	ლარი			1005.00		756.4939213		
	ჯამი	ლარი			1213.25		913.25		
	სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%		50.25		37.82469606		
	ჯამი	ლარი			1263.50		951.0746961		
	ზედნაღები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%		101.08		76.09		
	ჯამი	ლარი			1364.58		1027.16		
	გემშიური დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლარი	6%		81.87		61.63		
	სულ ჯამი	ლარი			1446.45		1088.79		

ხარჯთაღრიცხვა №5 მთა საჯოგოეიდან ადგილ ბოდი მდე წყალსადენის მაგისტრალის მოწყობაზე (=219 მმ)

დ=219 მმ ფოლადის მაგისტრალური მილსადენი მოწყობა										
1	IV	ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	900.00	5.00	4500.00			400.00	2000.00
2	IV	კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	160.00	15.00	2400.00			90.00	1350.00
3		ფოლადის მილის მონტაჟი დ=219X4 მმ პიდრავლიკური შემოწმებით	მ	5100.00	37.80	192780.00			3000.00	113400.00
4		მაგისტრალურ მილსადენზე დ=50 მმ ორმხრივი ვანტუზის კვანძის მოწყობა ფოლადის მილსადენში შეყრის მოწყობა	კომპლ	3.00	80.00	240.00				0.00
5		ლითონის მილების პიდროზოლაცია ბიტუმით 2 ფენა	მ2	3507.00	1.00	3507.00			2000.00	2000.00
6		ტრანშეის შევსება ადგილობრივი გრუნტით მექანიზმით	მ3	809.00	1.00	809.00			400.00	400.00
7		გრუნტის უკუმიწრა ხელით	მ3	170.00	8.00	1360.00			90.00	720.00
8		ზედმეტ გრუნტის მოსწორება მექანიზმით	მ3	91.00	1.00	91.00				
		ჯამი	ლარი			205687.00				119870.00
		მათ შორის:								
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			31689.00				18467.67
		2. მანქანები	ლარი			16178.00				9428.19
		3. მასალები	ლარი			157820.00				91974.13
		ჯამი	ლარი			205687.00				119870.00
		სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%		7891.00				4598.71
		ჯამი	ლარი			213578.00				124468.71
		ზედნაღები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%		17086.24				9957.50
		ჯამი	ლარი			230664.24				134426.20
		გველიური დაგროვება არაუმეტეს %	ლარი	6%		13839.85				8065.57
		სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვა №5	ლარი			244504.09				142491.78

ხარჯთაღრიცხვა №6 დგილ ბოდიშიდან ნეგოიანის მაგისტრალამდე წყალსადენის მაგისტრალის მოწყობაზე (დ=219 მმ)

დ=219 მმ ფოლადის მაგისტრალური მილსადენი მოწყობა										
1	IV	ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	1200.00	5.00	6000.00				
2	IV	კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	300.00	15.00	4500.00				
3		ფოლადის მილის მონტაჟი დ=219X4 მმ პიდრავლიკური შემოწმებით	მ	7500.00	37.80	283500.00				
4		მაგისტრალურ მილსადენზე დ=50 მმ ორმხრივი ვანტუზის კვანძის მოწყობა ფოლადის მილსადენში შეყრის მოწყობა	კომპლ	5.00	80.00	400.00				
5		თუჯის ურდული დ=100მ მონტაჟი პნ 16	ც	6.00	144.82	868.92				
6		ფოლადის მილტუქის მონტაჟი დ=100	ც	12.00	50.00	600.00				
7		ფოლადის მილი დ=100 მმ 4 მმ მონტაჟი	მ	8.00	20.00	160.00				
8		ლითონის მილების პიდროზოლაცია ბიტუმით 2 ფენა	მ2	5157.45	1.00	5157.45				
9		ტრანშეის შევსება ადგილობრივი გრუნტით მექანიზმით	მ3	1020.00	1.00	1020.00				
10		გრუნტის უკუმიწრა ხელით	მ3	170.00	8.00	1360.00				
11		ზედმეტ გრუნტის მოსწორება მექანიზმით	მ3	180.00	1.00	180.00				
		ჯამი	ლარი			303746.37				
		მათ შორის:								
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			26500.00				
		2. მანქანები	ლარი			14886.37				
		3. მასალები	ლარი			262360.00				
		ჯამი	ლარი			303746.37				
		სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%		13118.00				
		ჯამი	ლარი			316864.37				

ფოტოლუსტრაცია

ხულოს მუნიციპალიტეტის, მთა საჯოგოიდან წყლის მიყვანის სამუშაოები



[Handwritten signature]

ფოტოლუსტრაცია


ხულოს მუნიციპალიტეტის, მთა საჯოგიადან ნეგოიაში წყლის მიყვანის სამუშაოები



[Handwritten signature]

ფოტოილუსტრაცია

ხულოს მუნიციპალიტეტის, მთა საჯოგიადან ნეგოიაში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოები

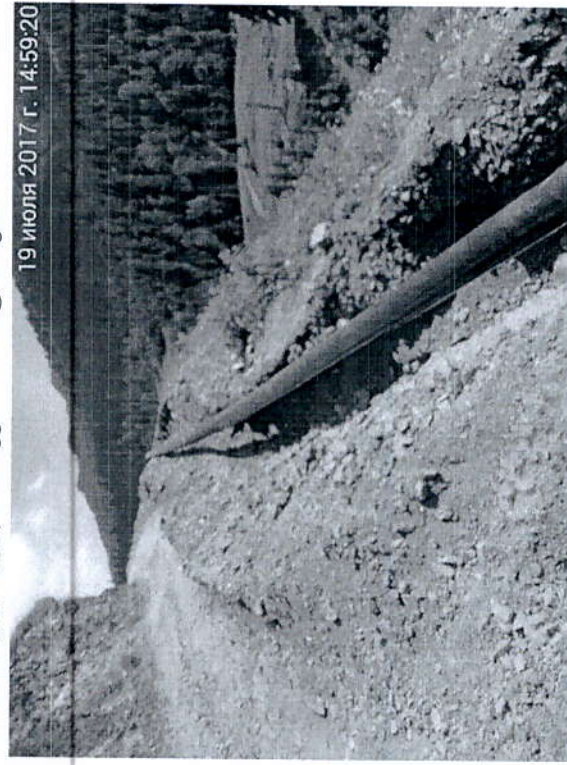

[Handwritten signature]

სამუშაოთა აქტი (მათ შორის ფარული)

საჯოვია
(შეღებვის ადგილი)

25 აგვისტო 2016 წ.
(შეღების თარიღი)

1. ჩვენ ქვემოთ, ამ აქტზე ხელის მომწერნმა:

I	დამკვეთი/ დამკვეთის წარმომადგენელი:	<u>ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა;</u>
I	ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი:	<u>ედნარ ბოლქვაძე, დამირ</u> <u>თავართქილაძე, რამინ ძირკვაძე, დათო</u> <u>იაკობაძე</u>
II	მენარდე/მენარდეს წარმომადგენელი:	<u>შპს "B&B"</u>
II	დირექტორი:	<u>ბერდია ბანძელაძე</u>

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მოვახდინეთ სამუშაოთა (მათ შორის ფარული) შუალედური შემოწმება

I	ობიექტის დასახელება	<u>მთა საჯოვიადან ნეკოიანში სსმული</u> <u>წყლის მიწვანის სამუშაოები</u>
II	ობიექტის მისამართი:	<u>მთა საჯოვია</u>

შემოწმების შედეგად დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

No	შესრულებული სამუშაოების დასახელება (მათ შორის ფარული)	გამომსახურებელი	რაოდენობა
1	2	3	4
1	<u>მელთხე ჯგუფის გროუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით</u>	<u>ა.ბ.მ</u>	<u>2.50</u>
2	<u>მელთხე კატეგორიის გროუნტის დამუშავება ხელით</u>	<u>ა.ბ.მ</u>	<u>0.50</u>
3	<u>დოკუმენტის და რეკონსტრუქციის ნახევარების მოწოდება B-20 ბეტონით</u>	<u>100 კმ.მ</u>	<u>0.04</u>
4			
5			

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტის ნახაზების მიხედვით, ხელშეკრულება N 162

3. შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება მათ დანიშნულებას;

(შეესაბამება/არ შეესაბამება.

4. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას ერთად შემდეგი სამუშაოების

წარმოებაზე:

წარმოებაზე:

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფის წევრები:

შპს. "B&B"

ბერდია ბანძელაძე

ედნარ ბოლქვაძე
რამინ ძირკვაძე
დამირ თავართქილაძე
დათო იაკობაძე

სამუშაოთა აქტი (მათ შორის ფარულად)

25 სექტემბერი	2016 წ.
(შედეგების თარიღი)	

1. ჩვენ ქვემოთ, ამ აქტზე ხელის მომწერმა:

I	1. ჩვენ ქვემოთ, ამ აქტზე ხელის მომწერნა:	ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
	დამკვეთი/ დამკვეთის წარმომადგენელი:	ედნარ ბოლოქვაძე დამირ
	ტექნიკური ზედამხედველობის ოფისი:	თავართქილაძე რამინ ძირკვამე, დათო იაკობაძე
II	მენარდე/მენარდეს წარმომადგენელი:	შპს "B&B"
	დირექტორი:	ბერდია ბანძელაძე

რომ მოახდინეთ სამუშაოთა (მათ შორის

II	დარიექტორი:	გელაშვილი გიორგი
სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მოვახდინეთ სამუშაოთა (მათ შორის ფარული) შუალედური შემოწმება		მთა საავტოდადან ნეკოიანში სსმელი

I	ობიექტის დასახელება	მთა საჯოგჯიდან ნეკოთანში სსმელო წყლის მიყვანის სამუშაოები
II	ობიექტის მისამართი:	მთა საჯოგჯი

შეპოწმების შედეგად დაზადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

№	შესრულებული სამუშაოების დასახელება (მათ შორის ფარული)	ფაქტობრივი ცალკეული ფასები	პროექტით პროგნოზირებული ფასები
1	2	3	4
2	მუხრანის რაიონის გზის დაბეჭევა ესპანეთში კავშირზე დაყრით	მ.შ	100.00
3	მუხრანის რაიონის გზის დაბეჭევა ხელის	მ.შ	70.00
4	ფილატის ტიპის მონეტის 159x4mm ტიპის დიდი ფილატის ტიპის მონეტის	მ	1000.00
5			
6			

2. სამუქაოები შესრულებულია პროექტის ნახაზების
მახედვით, ხელშეკრულება N 152

3 შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება მათ დანიშნულებას;

4. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას ვრთავთ ; შემდეგი სამუშაოების
ვრთავ/არ ვრთავთ

წამოვიყვანე,

აქტი ხწორია და ხელს ვაწერთ:
აქტიური ზედამხედველობის ჩაუყის წევრები:

ପଞ୍ଜାବ "B&B"

ზეორდია ზანძღლიძე

სამუშაოთა აქტი (მათ შორის ფარული)

<u>საჯოგია</u>
(შედეგის ადგილი)

15 სექტემბერი 2016 წ.
(შედეგის თარიღი)

1. ჩვენ ქვემოთ, ამ აქტზე ხელის მომწერნმა:

I	დამკვეთი/ დამკვეთის წარმომადგენელი:	<u>ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა;</u>
	ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი:	<u>ედნარ ბოლოქვაძე, დამირ</u> <u>თავართქილაძე, რამინ ძირკვაძე, დათო</u> <u>იაკობაძე</u>
II	მენარდე/მენარდეს წარმომადგენელი:	<u>შპს "B&B"</u>
	დირექტორი	<u>ბერდია ბანძელაძე</u>

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მოვახდინეთ სამუშაოთა (მათ შორის ფარული) შუალედური შემოწმება

I	ობიექტის დასახელება:	<u>ძია საჯოგიადან ნეგოიანში სსძელი</u> <u>წყლის მიყვანის სამუშაოები</u>
II	ობიექტის მისამართი:	<u>მთა საჯოგია</u>

შემოწმების შედეგად დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

№	შესრულებული სამუშაოების დასახელება (მათ შორის ფარული)	გამზარდობის ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	<u>ძალიან ჯგუფის გროუნტის დამუშავება კლასიკატორით ადგილზე დაყრით</u>	<u>კმ.მ</u>	<u>2.50</u>
2	<u>ძალიან კლასიკატორით გროუნტის დამუშავება ხელით</u>	<u>კმ.მ</u>	<u>0.50</u>
3	<u>დოკუმენტირება იმპლანტის ნაღობი დაღების მიწოდება B-20 პერსონალ</u>	<u>100 კმ.მ</u>	<u>0.04</u>
4			
5			

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტის ნახაზების მიხედვით, ხელშეკრულება N 162

3. შესრულებული სამუშაოები შესაბამება მათ დანიშნულებას;
(შესაბამება/არ შესაბამება)

4. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას ვრთავთ შემდეგი სამუშაოების
ერთავეთ/არ ვრთავთ

წარმოებაზე,

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფის წევრები.

შპს "B&B"

ედნარ ბოლოქვაძე
რამინ ძირკვაძე
დამირ თავართქილაძე
დათო იაკობაძე
ბერდია ბანძელაძე

სამუშაოთა აქტი (მათ შორის ფარული)

<u>საჯოგია</u>
(შედეგის ადგილი)

<u>30 სექტემბერი 2016 წ.</u>
(შედეგის თარიღი)

1. ჩვენ ქვემოთ, ამ აქტზე ხელის მომწერნმა:

I	დამკვეთი/ დამკვეთის წარმომადგენელი:	<u>ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა;</u>
	ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი:	<u>ედნარ ბოლუქვაძე, დამირ</u> <u>თავართქილაძე რამინ ძირკვაძე, დათო</u> <u>იაკობაძე</u>
II	მენარდე/მენარდეს წარმომადგენელი:	<u>შპს "B&B"</u>
	დირექტორი:	<u>ბერდია ბანძელაძე</u>

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მოვახდინეთ სამუშაოთა (მათ შორის ფარული) შუალედური შემოწმება

I	ობიექტის დასახელება	<u>მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სსტელი</u> <u>წყლის მიყვანის სამუშაოები</u>
II	ობიექტის მისამართი:	<u>მთა საჯოგია</u>

შემოწმების შედეგად დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

№	შესრულებული სამუშაოების დასახელება (მათ შორის ფარული)	საპროექტო ფაქტობრივი	რაოდენობა
1	2	3	4
1	<u>მთა საჯოგიდან ნეგოიანში სსტელი</u>	<u>ამტ</u>	<u>80.00</u>
2	<u>მთა საჯოგიდან ნეგოიანში სსტელი</u>	<u>ამტ</u>	<u>80.00</u>
3	<u>მთა საჯოგიდან ნეგოიანში სსტელი</u>	<u>მ</u>	<u>1300.00</u>
4			
5			
6			

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტის ნახაზების მიხედვით, ხელშეკრულება N 162

3. შესრულებული სამუშაოები შესაბამება მათ დანიშნულებას;

(შესაბამება/არ შესაბამება)

4. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას

ვრთავთ

ვრთავთ/არ ვრთავთ

შემდეგი სამუშაოების

(პროექტის მიხედვით)

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფის წევრები:

შპს. "B&B"

(Handwritten signatures and stamps)

ედნარ ბოლუქვაძე
რამინ ძირკვაძე
დამირ თავართქილაძე
დათო იაკობაძე
ბერდია ბანძელაძე

სამუშაოთა აქტი (მათ შორის ფარული)

№

მთა საჯოგია
(შედეგის ადგილი)

5 იანვარი 2016 წ.
(შედეგის თარიღი)

1. ჩვენ ქვემოთ, ამ აქტზე ხელის მომწერნმა:

I	დამკვეთი/ დამკვეთის წარმომადგენელი:	ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
	ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი:	ედნარ ბოლოქვაძე დამირ თავართქილაძე რამინ ძირკვაძე დათო იაკობაძე
II	მენარდე/მენარდეს წარმომადგენელი:	შპს "B&B"
	დირექტორი	ბერდია ბანძელაძე

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მოვახდინეთ სამუშაოთა (მათ შორის ფარული) შემოწმება

I	ობიექტის დასახელება:	მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოები
II	ობიექტის მისამართი:	მთა საჯოგია

შემოწმების შედეგად დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

№	შესრულებული სამუშაოების დასახელება (მათ შორის ფარული)	საშუალო გრძელობა მეტრებში	საფასო ლარი
1	2	3	4
1	4 კმ-ის გრუნტის დამუშავება კსკატორთა დილზე დაკრით	ქმ	400
2	4 კატეგორიის გრუნტის დატანა ხელით	ქმ	90
3	ფილატის მილის მოსაყდრე და 19x4 მმ კიდოვლი კურს შემოწმებით	მ	300

2.

სამუშაოები შესრულებულია პროექტის ნახაზების მიხედვით, ხელშეკრულება №162

3. შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება მათ დანიშნულებას;

(შეესაბამება/არ შეესაბამება)

4. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას

ვრთავთ

შემდეგი სამუშაოების

ერთგვარად ექიმება

წარმოებაზე;

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფის წევრები:

ი.მ. "B&B"

დათო იაკობაძე

ბერდია ბანძელაძე

